## Τίτλος τεχνικού κειμένου: Project Plan version 0.1

Ονομασία του έργου: ProjAuction

#### Μέλη της ομάδας:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

**AM:**1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**AM:** 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΩΛΟΣ

**AM:** 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

**AM**: 1067395

Μέλη της ομάδας που συμμετείχαν στο συγκεκριμένο τεχνικό κείμενο:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

**AM:**1056277

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**AM:** 1040859

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΣΩΛΟΣ

**AM:** 1054412

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΜΠΑΚΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ


**AM:** 1067395

### Παρουσιάζουμε αρχικά τον πίνακα υποέργων:

ТҮПІКА ҮПОЕРГА	ΑΡΙΘΜΟΣ	ПРОАПАІТОУМЕNА УПОЕРГА	ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΜΕΡΕΣ	ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΜΕΡΕΣ	ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΜΕΡΕΣ
TY1: Meeting με τον πελάτη	1	-	1	1	2
ΤΥ2: Δημιουργία πλάνου ομάδας	2	TY1	2	3	4
TY3: Εξαγωγή System Requirements	3	TY2	2	4	5
ΤΥ4: Ανάλυση ρίσκων-Κινδύνων	4	TY3	2	3	4
TY5: Σχεδιασμός GUI Employer	5	TY3	9	11	14
TY6: Σχεδιασμός GUI Freelancer	6	TY3	9	11	14
ΤΥ7: Σχεδιασμός GUI Admin	7	TY3	9	11	14
TY8: Σχεδιασμος Use-Cases Diagram	8	TY5 TY6 TY7	8	10	14
TY9: Σχεδιασμός Class Diagram	9	TY5 TY6 TY7	8	10	12
TY10: Σχεδιασμός Robustness Diagram	10	TY8	6	7	9
TY11: Σχεδιασμός Sequence Diargam	11	TY10	2	4	5
ΤΥ12: Αναθεωρήσεις Διαγραμμάτων	12	TY9 TY11	2	4	5
TY13: Σχεδιασμός DataBase	13	TY12	10	12	15
TY14: Ανάπτυξη GUI Employer	14	TY13	12	15	17
TY15: Ανάπτυξη GUI Freelancer	15	TY13	12	15	17
TY16: Ανάπτυξη GUI Admin	16	TY13	12	15	17
TY17: Ανάπτυξη DataBase	17	TY13	14	18	20
TY18: System Communication Check	18	TY14 TY15 TY16 TY17	2	3	5
TY19: System Operation Check	19	TY18	2	3	5
TY20: Meeting με τον πελάτη για αξιολόγηση	20	TY19	1	2	3
TY21: Τροποποίηση με βάση το Feedback του πελάτη	21	TY20	13	15	20
ΤΥ22: Τελικός έλεγχος	22	TY21	2	3	5
ΤΥ23: Παράδοση στον πελάτη	23	TY22	1	1	2


### Έπειτα παρουσιάζουμε το Pert Chart:

Με τη διαδικασία υλοποίησης του έργου μας να ξεκινάει στην  $\mathbf{1}^{n}$  Μαρτίου και αφετηρία την ημέρα της  $\mathbf{11}^{n\varsigma}$  Ιουνίου.

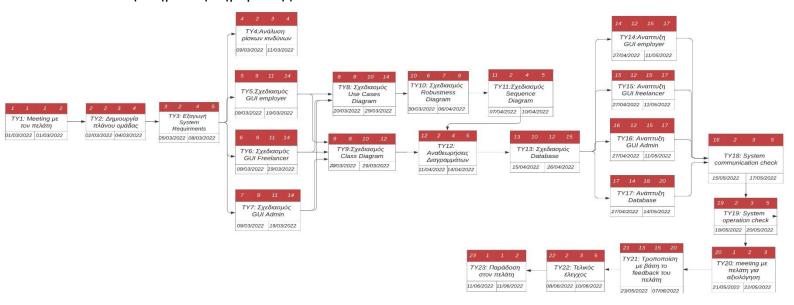

#### \*Μεγεθύνετε την εικόνα

### Στη συνέχεια παραθέτουμε το **Gantt Chart**:

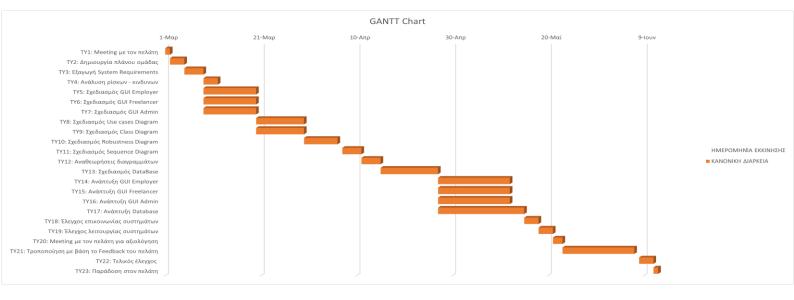

#### ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΡΓΟΥ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η ομάδα μας αποτελείται από 4 άτομα:

- Δημήτρης
- Νώντας
- Χρήστος
- Γιώργος

Ο ρόλος του manager έχει ανατεθεί στο Δημήτρη

Παρακάτω παραθέτουμε την ανάθεση έργου σε κάθε ένα από τα 4 μέλη της ομάδας.

## Ανάθεση εργασίας στον Δημήτρη:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ				
<b>ҮПОЕРГО</b>	ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	% ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (MAN-HRS x 100€)
TY1	1	100%	1,00	100,00€
TY2	3	100%	3,00	300,00€
TY3	4	100%	4,00	400,00€
TY4	3	100%	3,00	300,00€
TY14	15	25%	3,75	375,00€
TY15	15	25%	3,75	375,00€
TY16	15	25%	3,75	375,00€
TY17	18	25%	4,50	450,00€
TY18	3	100%	3,00	300,00€
TY19	3	100%	3,00	300,00€
TY20	2	100%	2,00	200,00€
TY21	15	100%	15,00	1.500,00€
TY22	3	100%	3,00	300,00€
TY23	1	100%	1,00	100,00€
			53,75	5.375,00 €

## Ανάθεση εργασίας στον Νώντα:

	ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΩΝΤΑ				
ΥΠΟΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	% ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (MAN-HRS x 80€)	
TY5	11	30%	3,30	264,00€	
TY6	11	30%	3,30	264,00€	
TY7	11	40%	4,40	352,00€	
TY8	10	50%	5,00	400,00€	
TY9	10	50%	5,00	400,00€	
TY10	7	100%	7,00	560,00€	
TY11	4	50%	2,00	160,00€	
TY12	4	50%	2,00	160,00€	
TY13	12	100%	12,00	960,00€	
TY14	15	25%	3,75	300,00€	
TY15	15	25%	3,75	300,00€	
TY16	15	25%	3,75	300,00€	
TY17	18	25%	4,50	360,00€	
			59,75	4.780,00 €	

## Ανάθεση εργασίας στον Χρήστο

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ				
<b>ҮПОЕРГО</b>	ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	% ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (MAN-HRS x 80€)
TY5	11	30%	3,30	264,00€
TY6	11	30%	3,30	264,00€
TY7	11	40%	4,40	352,00€
TY8	10	50%	5,00	400,00€
TY9	10	50%	5,00	400,00€
TY10	7	100%	7,00	560,00€
TY11	4	50%	2,00	160,00€
TY12	4	50%	2,00	160,00€
TY13	12	100%	12,00	960,00€
TY14	15	25%	3,75	300,00€
TY15	15	25%	3,75	300,00€
TY16	15	25%	3,75	300,00€
TY17	18	25%	4,50	360,00€
			59,75	4.780,00 €

# Ανάθεση εργασίας στον Γιώργο

	ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ				
ΥΠΟΕΡΓΟ	ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	% ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (MAN-HRS x 80€)	
TY5	11	30%	3,30	264,00€	
TY6	11	30%	3,30	264,00€	
TY7	11	40%	4,40	352,00€	
TY8	10	50%	5,00	400,00€	
TY9	10	50%	5,00	400,00€	
TY10	7	100%	7,00	560,00€	
TY11	4	50%	2,00	160,00€	
TY12	4	50%	2,00	160,00€	
TY13	12	100%	12,00	960,00€	
TY14	15	25%	3,75	300,00€	
TY15	15	25%	3,75	300,00€	
TY16	15	25%	3,75	300,00€	
TY17	18	25%	4,50	360,00€	
			59,75	4.780,00 €	

#### ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Επιπλέον παραθέτουμε και τα επιπλέον απαιτούμενα κόστη:

> Κόστος για αγορά Server: 4000€

≻ Κόστος για αγορά λογισμικού: 1000€

Πάγια έξοδα για τη λειτουργία της επιχείρησης (ενοίκιο, ρεύμα, τηλεφωνική σύνδεση): 1600€

Επομένως προκύπτει ο παρακάτω τελικός πίνακας:

		AMOIBH ANA	
	ΑΝΘΡΩΠΟΗΜΕΡΕΣ	ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ	AMOIBH
ΔΗΜΗΤΡΗΣ	53,75	100,00€	5.375,00€
ΝΩΝΤΑΣ	59,75	80,00€	4.780,00€
ΧΡΗΣΤΟΣ	59,75	80,00€	4.780,00€
ΓΙΩΡΓΟΣ	59,75	80,00€	4.780,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ			19.715,00€
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΤΗ			6.600,00€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			26.315,00 €

Όσον αφορά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την συγγραφή του τεχνικου κειμένου:

- Το τεχνικό κείμενο γράφτηκε σε Microsoft Word.
- Ό πίνακας υποέργων, το διάγραμμα Gantt καθώς και οι πίνακες ανάθεσης έργου και κοστολόγησης υλοποιήθηκαν στο Microsoft Excel
- Το διάγραμμα Pert υλοποιήθηκε στο πρόγραμμα Lucid Chart.
